


北京市石景山区新首钢国际人才社区核心区
SS00-1609-0012 地块项目
地形及地上物测绘技术报告书

项目名称：石景山区新首钢国际人才社区核心区
SS00-1609-0012 地块项目

开发主体：北京市土地储备中心

项目坐落：石景山区古城街道首钢园北区



地形及地上物测绘技术报告书目录

受托测绘声明	共 1 页
测绘说明	共 1 页
测绘成果	
一. 北京市石景山区新首钢国际人才社区核心区 SS00-1609-0012 地块项目地形及地上物测绘平面图.....	共 1 页
二. 测绘情况汇总表（表 1）	共 1 页
三. 项目范围内未拆除地上建筑物明细表（表 2）	共 1 页
四. 界桩坐标成果表（表 3）	共 1 页
五. 项目现场照片.....	共 2 页

受托测绘声明

一、本技术报告是受北京市土地储备中心的委托出具，其测绘成果系按照国家和本市有关技术规范完成。

二、委托方已声明对所有提供的用于本项目测绘的资料的准确性和真实性负责。

三、本测绘成果仅作为委托方委托测绘的北京市石景山区新首钢国际人才社区核心区 SS00-1609-0012 地块项目土地开发项目现场验收使用，不作为其他用途。

四、作业人员张少辉对本项目进行了实地测量，由刘俊霞内业编制完成，并由任淑娟检查、审核后提供。

测绘说明

一、概述：

受 北京市土地储备中心 委托，北京宏勘科技有限公司对坐落于 北京市石景山区新首钢国际人才社区核心区
SS00-1609-0012 地块项目 土地开发项目的用地范围及用地范围内的所有地上物和土地平整情况进行了地形及地上物测绘。实测该项目用地总面积为 16626.580 平方米，其中建设用地面积 16626.580 平方米、代征道路面积 0.000 平方米、代征绿地面积 0.000 平方米、代征河道面积 0.000 平方米，测绘界桩点 11 个、高程点 30 个，采用全站仪极坐标法施测，各种内外业资料均进行了检查，符合国家和本市有关技术规范要求。

二、本技术报告使用的长度单位为“米”，面积单位为“平方米”。

三、测绘技术标准：执行国家和本市有关技术规范

四、测绘日期：2025 年 11 月 29 日

五、委托方名称：


委托方地址：

委托方经办人：

委托方电话：

北京市石景山区新首钢国际人才社区核心区SS00-1609-0012地块项目地形及地上物测绘平面图

北
1: 2000

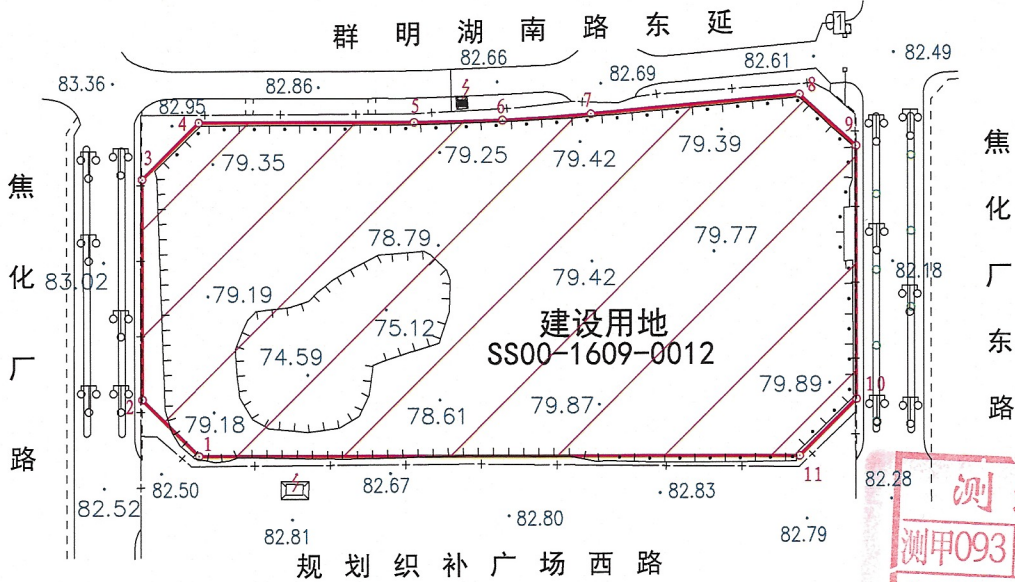

- 11-1 : 158.882
- 10-11 : 21.213
- 9-10 : 66.846
- 8-9 : 20.216
- 7-8 : 55.427
- 6-7 : 23.439
- 5-6 : 23.439
- 4-5 : 56.940
- 3-4 : 21.213
- 2-3 : 58.229
- 1-2 : 21.213

测绘成果专用章
测甲093 北京宏勘科技有限公司
证书编号 证书分类 资质等级
11112710 测绘 甲级
有效期至2029年07月04日止

单位: 米
图幅号: [V-4-2-[24]
坐落: 石景山区古城街道首钢园北区

图 例			
建设用地范围线	围 挡	加固陡坎	
高程注记	路 灯	未加固陡坎	

项目名称	石景山区新首钢国际人才社区核心区SS00-1609-0012地块项目		
开发主体	北京市土地储备中心	用地性质	
		用地总面积	16626.580平方米
	其 中		
建设用地面积	16626.580平方米	代征绿地面积	0.000平方米
代征道路面积	0.000平方米	代征河道面积	0.000平方米
测绘单位	北京宏勘科技有限公司	测绘日期	2025年11月29日

北京地方坐标系 北京地方高程系

测量员: 张少辉 绘图员: 刘俊霞 检查员: 任淑娟

测绘情况汇总表

(表 1)

项目名称：石景山区新首钢国际人才社区核心区 SS00-1609-0012 地块项目

项目名称	石景山区新首钢国际人才社区核心区 SS00-1609-0012 地块项目										项目坐落		石景山区古城街道首钢园北区									
开发主体	北京市土地储备中心										测绘日期		2025 年 11 月 29 日									
项目基本情况	用地总面积			16626. 580 m ²							建设用地性质											
	其中			建设用地面积				16626. 580 m ²														
				代征道路面积				0. 000 m ²														
				代征绿地面积				0. 000 m ²														
				代征河道面积				0. 000 m ²														
项目范围内地上附着物情况	名称	建筑物	上水井	下水井	通信井	电力井	热力井	燃气井	不明用途井	路灯	高压杆	低压杆	通讯杆	变压器	配电箱	高压塔	独立坟	通信发射塔	围墙围挡	树木		
	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	见平面图	见平面图		
	建设用地内含	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	见平面图	见平面图		
	代征道路内含	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	见平面图	见平面图		
	代征绿地内含	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	见平面图	见平面图		
未拆除地上建筑物面积统计	总建筑面积			总建筑占地面积			进入项目范围内总建筑面积			进入项目范围内总建筑面积			进入建设用地内的总建筑面积			进入建设用地内的总建筑面积						
	0. 00 m ²			0. 00 m ²			0. 00 m ²			0. 00 m ²			0. 00 m ²			0. 00 m ²						
	详见项目范围内未拆除地上建筑物明细表（表 2）																					
土地平整情况	依据现场实测情况判定，该项目土地自然地平。																					
宗地四至	东： 焦化厂东路										南： 规划织补广场西路											
	西： 焦化厂路										北： 群明湖南路东延											
测绘依据	1. 建设工程规划用地测量成果报告书： 2025 规自（石）测字 0007 号																					

项目范围内未拆除地上建筑物明细表

(表 2)

项目名称：石景山区新首钢国际人才社区核心区 SS00-1609-0012 地块项目

(单位：m²)

编号	总建筑面积	总建筑占地面积	进入项目范围内的建筑 面积	进入项目范围内的建筑 占地面积	进入建设用地内的建筑 面积	进入建设用地内的建筑 占地面积	实际用途 (仅供参考)
①							
②							
③							
④							
⑤							
⑥							
⑦							
⑧							
⑨							
⑩							
⑪							
⑫							
⑬							
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							
⑳							
总计							

注：表内编号与平面图上未拆除地上建筑物编号相对应。


界 桩 坐 标 成 果 表

(表3)

项目名称：石景山区新首钢国际人才社区核心区SS00-1609-0012地块项目

点 号	坐 标		距离（米）	界桩材料	备 注
	x	y			
1	304658.354	483180.639		喷 涂	
2	304673.354	483165.639	21.213	喷 涂	
3	304731.583	483165.639	58.229	喷 涂	
4	304746.583	483180.639	21.213	喷 涂	
5	304746.583	483237.579	56.940	喷 涂	
6	304747.122	483261.010	23.439	喷 涂	
7	304748.736	483284.392	23.439	喷 涂	
8	304753.824	483339.584	55.427	喷 涂	
9	304740.200	483354.521	20.216	喷 涂	
10	304673.354	483354.521	66.846	喷 涂	
11	304658.354	483339.521	21.213	喷 涂	
1	304658.354	483180.639	158.882	喷 涂	

略图：

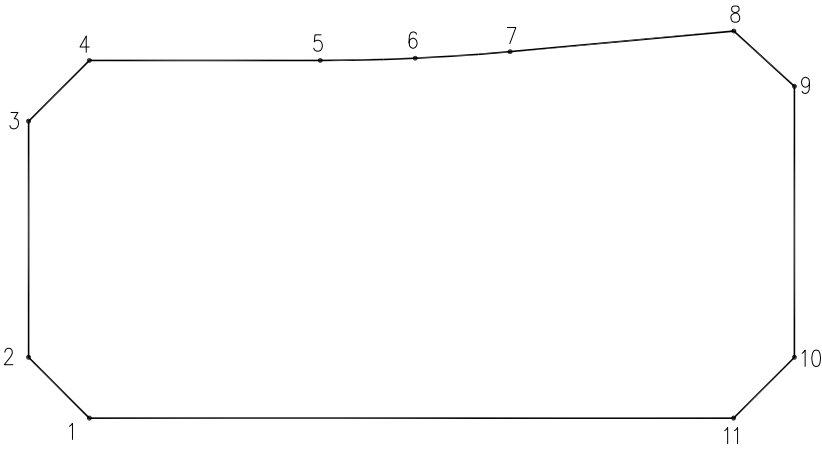

项目现场照片




项目东侧现状道路



项目西侧现状道路




项目北侧现状道路

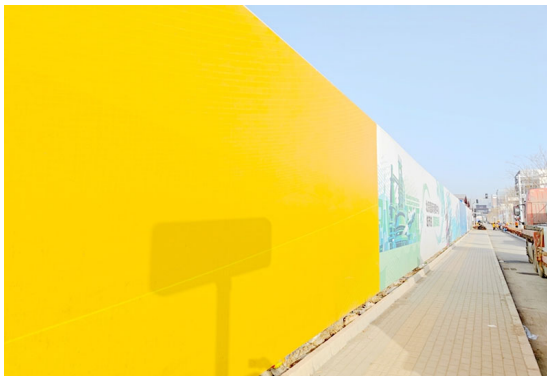

项目东侧围挡



项目南侧围挡

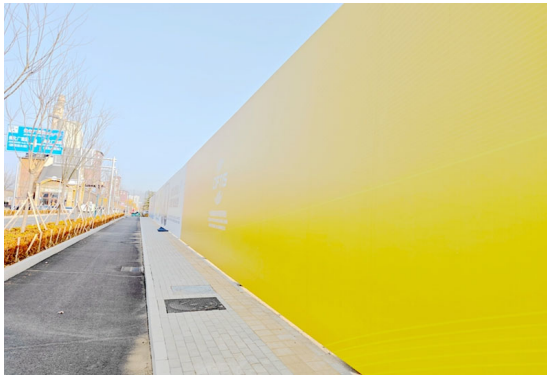

项目西侧围挡



项目北侧围挡



项目内陡坎

项目现场照片



项目内坑



土地平整情况



土地平整情况



土地平整情况



土地平整情况



土地平整情况



土地平整情况



土地平整情况
